

**Бережливый проект  
«Оптимизация проведения школьного этапа  
всероссийской олимпиады школьников  
на территории Воронежской области»  
(с 17.07.2022 по 07.11.2022)**

Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение  
Воронежской области  
«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов  
у детей и молодежи «Орион»

# Паспорт бережливого проекта

ПАСПОРТ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОЕКТА	
«Оптимизация проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Воронежской области»	
<b>СОГЛАСОВАНО</b> Владелец процесса Директор ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион» Н.Н. Голева	<b>УТВЕРЖДАЮ</b> Заказчик проекта Руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Н.В. Салогубова
<b>Описание проекта</b> Область применения: образование обучающихся в рамках основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительных образовательных программ и самообразования. Периметр проекта: ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования Воронежской области (34 муниципальных образования), образовательные организации Воронежской области, реализующие основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, ГБУ ДПО ВО «Институт развития образования имени Н.Ф. Бунакова». Границы проекта: от подготовки нормативно-правовой базы до официального опубликования итогов проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников.	<b>Потребитель</b> Потребитель: обучающиеся 4-11 классов образовательных организаций Воронежской области, осваивающие основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительного образования и самообразования. Ценность для потребителя: 1. Доступность участия в школьном этапе всероссийской олимпиады для всех школьников региона. 2. Удобство формата проведения Олимпиады (цифровой образовательный портал Воронежской области). 3. Равные условия участия для всех школьников региона (единая база заданий, критерии оценивания, автоматизированная система подведения итогов).
<b>Команда проекта</b> Руководитель проекта: Н.Н. Голева – директор ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион» Команда проекта: Говорова М.А. – педагог-организатор отдела реализации образовательных событий ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион», Кроль Л.А. – педагог-организатор отдела реализации образовательных событий ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион», Бабенко А.В. – начальник отдела информационно-коммуникационных связей ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион», Зарайский С.О. – инженер-программист отдела информационно-коммуникационных связей ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион».	<b>Обоснование выбора</b> Описание проблем: 1. Отсутствие информации о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады. 2. Отсутствие равных условий проведения участников школьного этапа в школьникам (единой базы заданий автоматизированной системы подведения

**Администратор проекта:** Удовиченко Е.А. – старший методист отдела реализации образовательных событий ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион»

**Кураторы проекта:** Попова О.Н. - инженер управления инженерной поддержки Нововоронежской АЭС; Коновалов Е.В. - главный специалист отдела оптимизации процессов государственного управления КУ ВО «Центр эффективности правительства Воронежской области».


Цели проекта			
Наименование цели	Ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Увеличение количества работ участников Олимпиады по 24 общеобразовательным предметам на Цифровых образовательных платформах	работ	125 136	360 614
2. Увеличение количества общеобразовательных предметов школьного этапа Олимпиады, проводимых на цифровых платформах	шт.	6	24
3. Сокращение времени ожидания первичного результата	час	72	0,01
4. Сокращение времени на обработку результатов (рейтинговый список)	дни	14	7

**Основные риски проекта:**  
 1. Возникновение непредвиденных технических сбоев на цифровом образовательном портале Воронежской области в дни проведения Олимпиады.

План этапов проекта:	
1. Старт проекта (дата):	11.07.2022
2. Диагностика:	с 18.07.2022 по 19.08.2022
3. Внедрение изменений:	с 22.08.2022 по 31.10.2022
4. Завершение проекта (дата):	07.11.2022
5. Мониторинг изменений:	с 08.11.2022 по 27.01.2023



# Анкетирование № 1

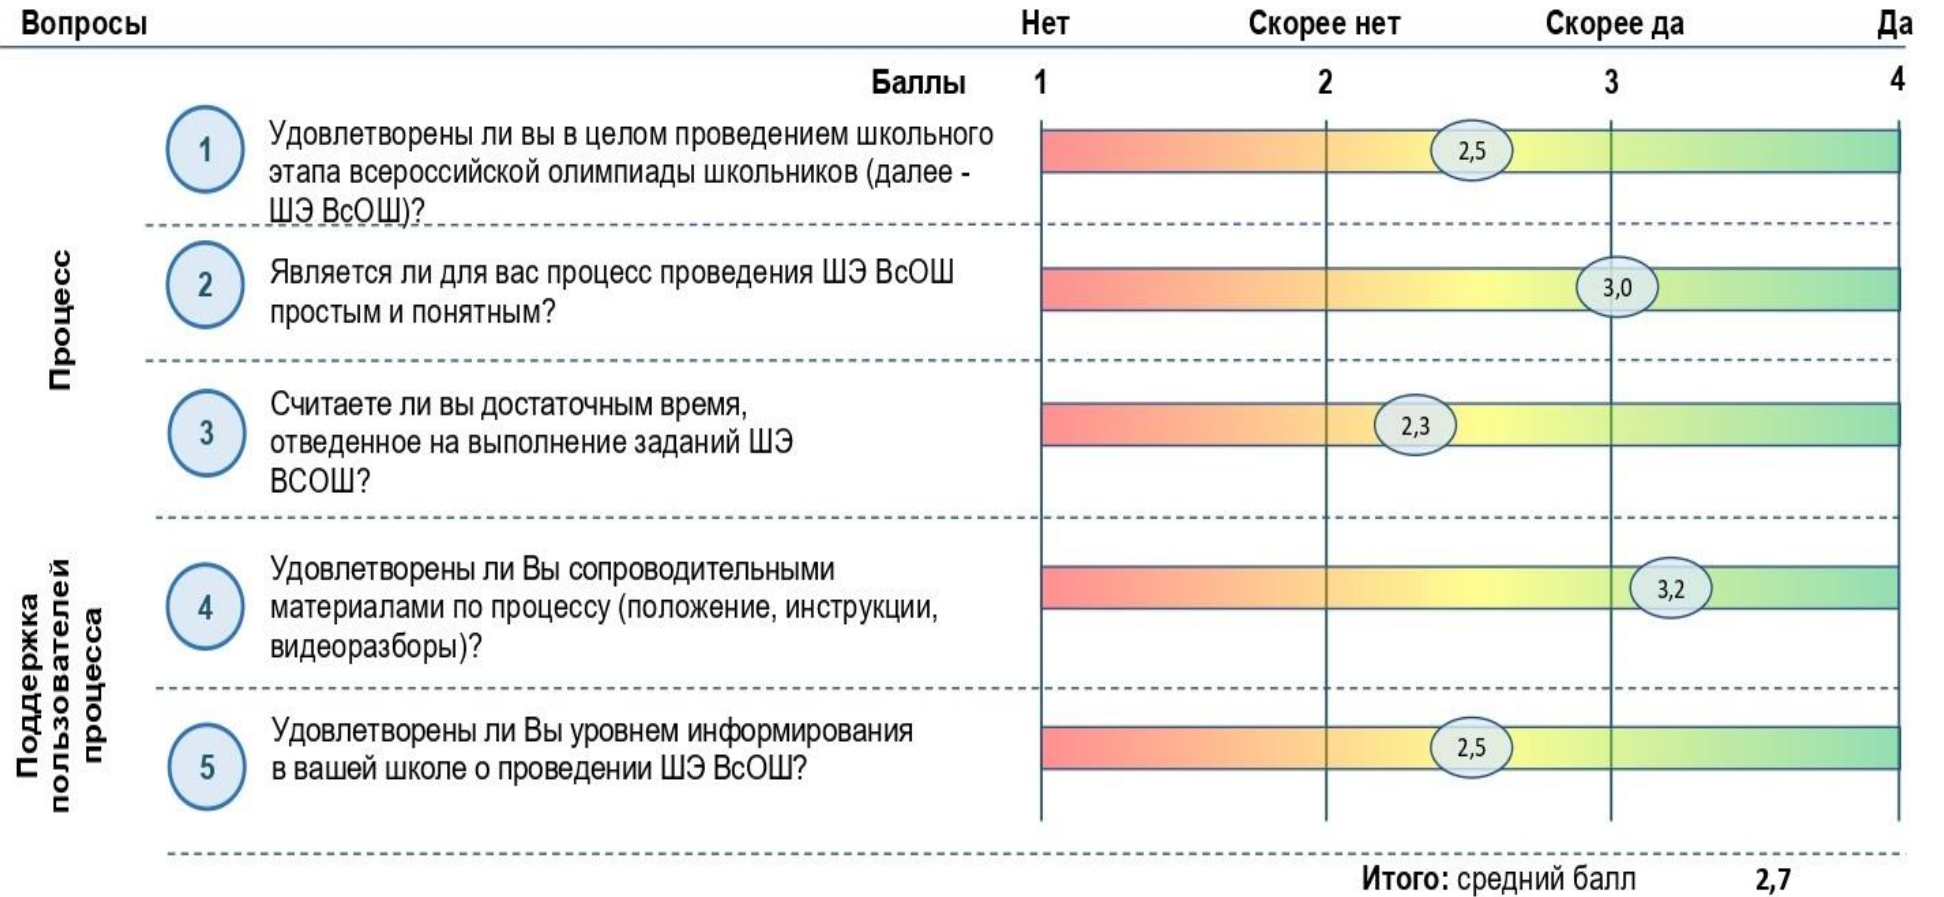



<b>Анкетирование № 1</b>	Мирошникова С.	Севидов И.	Петухова К.	Кононова Т.	Язева А.	Солнцев А.	Спицын Г.	Некрасов С.	Сенцов Р.	Гаспарик А.
Удовлетворены ли вы в целом проведением школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - ШЭ ВСОШ)?	Скорее нет	Нет	Да	Скорее нет	Скорее да	Да	Скорее нет	Нет	Скорее да	Скорее да
Является ли для вас процесс проведения ШЭ ВСОШ простым и понятным?	Нет	Да	Скорее да	Да	Скорее да	Скорее нет	Скорее да	Да	Скорее нет	Да
Считаете ли вы достаточным время, отведенное на выполнение заданий ШЭ ВСОШ?	Скорее нет	Нет	Скорее нет	Нет	Скорее нет	Скорее нет	Нет	Скорее да	Скорее нет	Нет
Удовлетворены ли Вы сопроводительными материалами по процессу (положение, инструкции, видеоразборы)?	Да	Да	Нет	Скорее да	Да	Да	Нет	Скорее да	Да	Да
Удовлетворены ли Вы уровнем информирования в вашей школе о проведении ШЭ ВСОШ (уведомляют ли вас о проведении этапа, о возможности поучаствовать в Олимпиаде по любому из 24 общеобразовательных предметов, о преимуществах участия во ВСОШ)?	Нет	Нет	Скорее нет	Скорее да	Скорее да	Нет	Да	Скорее нет	Да	Да



# Анкетирование № 2

Вопросы	Баллы	Нет	Скорее нет	Скорее да	Да	
		1	2	3	4	
Процесс	1	Удовлетворены ли вы в целом проведением школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - ШЭ ВСОШ)?				3,2
	2	Является ли для вас процесс проведения ШЭ ВСОШ простым и понятным?				3,9
	3	Считаете ли вы достаточным время, отведенное на выполнение заданий ШЭ ВСОШ?				3,6
Поддержка пользователей процесса	4	Удовлетворены ли Вы сопроводительными материалами по процессу (положение, инструкции, видеоразборы)?				3,3
	5	Удовлетворены ли Вы уровнем информирования в вашей школе о проведении ШЭ ВСОШ?				3,4
<b>Итого: средний балл</b>					<b>3,48</b>	

Страница 1



<b>Анкетирование № 2</b>	Мирошникова С.	Севидов И.	Петухова К.	Кононова Т.	Язева А.	Солнцев А.	Спицын Г.	Некрасов С.	Сенцов Р.	Гаспарик А.
Удовлетворены ли вы в целом проведением школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - ШЭ ВСОШ)?	Скорее да	Скорее да	Да	Скорее да	Скорее да	Да	Скорее да	Скорее да	Скорее да	Скорее да
Является ли для вас процесс проведения ШЭ ВСОШ простым и понятным?	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Скорее да	Да
Считаете ли вы достаточным время, отведенное на выполнение заданий ШЭ ВСОШ?	Скорее да	Да	Скорее да	Да	Скорее да	Да	Да	Да	Скорее да	Да
Удовлетворены ли Вы сопроводительными материалами по процессу (положение, инструкции, видеоразборы)?	Да	Да	Скорее да	Скорее да	Скорее да	Да	Скорее нет	Да	Скорее да	Скорее да
Удовлетворены ли Вы уровнем информирования в вашей школе о проведении ШЭ ВСОШ (уведомляют ли вас о проведении этапа, о возможности поучаствовать в Олимпиаде по любому из 24 общеобразовательных предметов, о преимуществах участия во ВСОШ)?	Скорее да	Скорее да	Скорее нет	Да	Скорее да	Скорее да	Да	Да	Да	Да





# Карта текущего состояния

Учебный предмет	1	2	3	4	5	6	7	8	Учебный курс
Всего МЭУ по	14	13	14	28	21	41	11	14	138
Всего МЭУ по	7	7	7	21	14	41	4	7	108

Учебный предмет	Министерство просвещения	Департамент образования	Орган местного самоуправления, осуществляющий полномочия в сфере образования	Муниципальная предметно-методическая комиссия	Образовательная организация (директор)	Образовательная организация (учитель)	1	2	3	4	5	6	7	8
	Подготовка Методических рекомендаций по проведению ШЭ В-ОШ (2) проведение установочных вебинаров о проведении В-ОШ (2)													
		Подготовка НПА (1) (приказ о проведении ШЭ В-ОШ (2) Утверждение ОТМ (3) ШЭ В-ОШ (2)												
			Подготовка НПА (1) (приказ о проведении ШЭ В-ОШ (2) Создание муниципального орг. комитета Создание комиссии жюри Создание апелляционной комиссии Утверждение графика проведения ШЭ В-ОШ (2)											
				Разработка заданий ШЭ В-ОШ (2)										
					Подготовка локальных актов Назначение ответственных за проведение В-ОШ (2), за хранение согласий на обработку персональных данных и работ обучающихся									
						Проведение ШЭ В-ОШ (2)	Проверка работ ШЭ В-ОШ (2)	Подведение итогов ШЭ В-ОШ (2)						


- Проблемы**
- Разработка заданий школьными учителями
  - Разнородность, разноуровневость заданий, отсутствие стандарта для всех школ региона
  - Отсутствие рекламной кампании внутри школы
  - Невозможность для обучающегося принять участие в случае фактического отсутствия в образовательной организации
  - Отсутствие равных условий проверки (единых критериев оценки)
  - Невозможность соотнести результаты обучающихся разных муниципальных районов области
  - Затянутость времени ожидания личного результата обучающегося и общих рейтинговых списков

Примечания
1. НПА - нормативно-правовые акты
2. ШЭ В-ОШ - школьный этап всероссийской предметной олимпиады школьников
3. ОТМ - организационно-технологическая модель
4. ОМСУ - органы местного самоуправления

 Дрoзжает дeлaть  
 Не дoзвoляет дeлaть



# Проблемы

	Разработка заданий школьными учителями
	Разнородность, разноуровневость заданий, отсутствие стандарта для всех школ региона □
	Отсутствие рекламной кампании внутри школы
	Невозможность для обучающегося принять участие в случае фактического отсутствия в образовательной организации
	Отсутствие равных условий проверки (единых критериев оценки)
	Невозможность соотнести результаты обучающихся разных муниципальных районов области
	Затянутость времени ожидания личного результата обучающегося и общих рейтинговых списков



Статистический анализ № 1


Проект «Оптимизация проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Воронежской области»

№	Этап процесса	Номер замера										Среднее значение
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Изучение методических рекомендаций по общеобразовательному предмету	5	5	2	4	5	5	4	3	5	3	4,1
2	Разработка комплектов заданий по общеобразовательному предмету для 4-6 классов	7	5	3	5	6	6	3	5	5	3	4,8
3	Разработка комплектов заданий по общеобразовательному предмету для 7-8 классов	9	7	5	7	7	5	5	7	7	5	6,4
4	Разработка комплектов заданий по общеобразовательному предмету для 9-11 классов	12	8	7	13	15	15	12	10	14	7	11,3
<b>ИТОГО по процессу, фактическое время, ед. измерения (дни)</b>		33	25	17	29	33	31	24	25	31	18	26,6
		Английский язык	Биология	Русский язык	Математика	Физика	Химия	Технология	Литература	Историческая культура	Астрономия	





Динамика замеров статистического анализа № 1

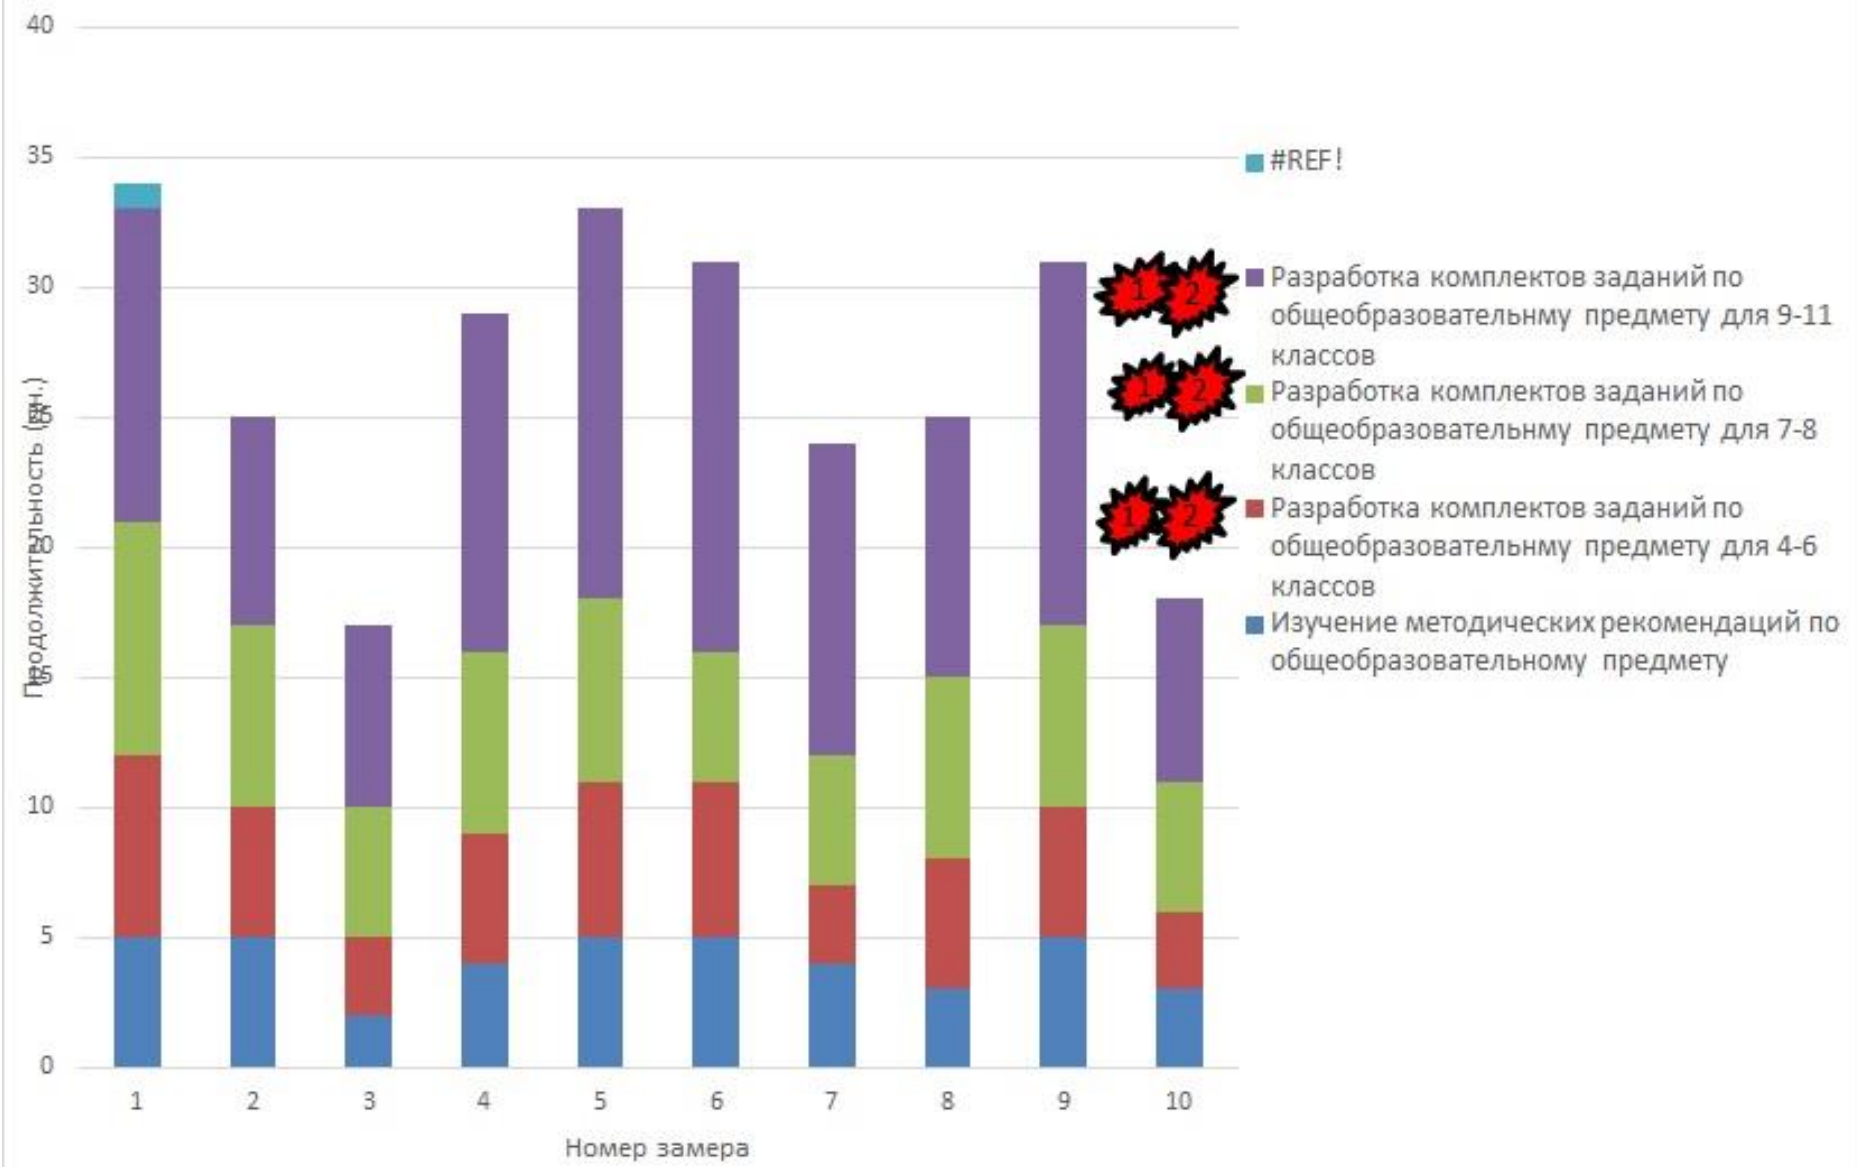

# Карта целевого состояния

Карта ЦЕЛЕВОГО состояния ПСЦ бережливого проекта «Оптимизация проведения школьного этапа ВСОШ»

№ по порядку	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Итого
Всего МСУ, шт	14	7	14	2	14	6	40	7	14	129
Всего МТУ, шт	7	4	7	1	7	3	40	1	7	29

Участник процесса	1	2	3	4	5	6	7	8	9
заместитель директора	Подготовка НПА (1) для проведения ШЭ ВСОШ (2)								
начальник отдела сопровождения интеллектуальных состязаний	@			Всесторонний вебинар для смены листов ОМСУ (4)		Проведение вебинаров для ОМСУ (4) по вопросам организации и проведения ШЭ ВСОШ (2)			
старший методист отдела сопровождения интеллектуальных состязаний	формирование ТЗ (3) по 18 предметам	Заказ на разработку заданий	Принятие готовых заданий от разработчиков	@		Взаимодействие с ОМСУ (4) по вопросам проведения ШЭ ВСОШ (2)		Обработка результатов всех участников по каждому из 24 предметов	Подготовка итоговых НПА (1)
педагог-организатор отдела сопровождения интеллектуальных состязаний		@	@	@					
педагог-организатор отдела сопровождения интеллектуальных состязаний	@		Информирование о проведении ШЭ ВСОШ (2) (информационный писемка)					@	
педагог-организатор отдела сопровождения интеллектуальных состязаний									
начальник отдела информационно-коммуникационных связей			Информационное сопровождение (социальные сети, сайт)						Публикация итогов ШЭ ВСОШ (2)
специалист отдела информационно-коммуникационных связей	Подготовка платформ для проведения Олимпиады: 1. <a href="https://vsoh-vp.scoi.sci.ru/">https://vsoh-vp.scoi.sci.ru/</a> - НПА (1), графика проведения, итоги; 2. <a href="https://portal.vtmb.ru/">https://portal.vtmb.ru/</a> - тестирующая система		Загрузка заданий на платформу и инструкции	Тестирование платформы				Техническое сопровождение ШЭ ВСОШ (2)	Выгрузка результатов и передача их для обработки

Доказывает четкость  
 Не доказывает четкость

Примечания	1. НПА - нормативно-правовые акты
	2. ШЭ ВСОШ - школьный этап всероссийской олимпиады школьников
	3. ТЗ - техническое задание
	4. ОМСУ - органы местного самоуправления






## Проект «Оптимизация проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Воронежской области»




№	Этап процесса	Номер замера										Среднее значение
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Изучение методических рекомендаций по общеобразовательному предмету	3	2	1	2	3	3	2	1	2	1	2
2	Разработка комплектов заданий по общеобразовательному предмету для 4-6 классов	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3,5
3	Разработка комплектов заданий по общеобразовательному предмету для 7-8 классов	5	4	3	5	5	5	4	5	4	4	4,4
4	Разработка комплектов заданий по общеобразовательному предмету для 9-11 классов	6	6	3	5	5	5	6	5	6	4	5,1
<b>ИТОГО по процессу, фактическое время, ед. измерения (дни)</b>		17	15	10	16	17	17	15	15	16	12	15
		Английский язык	Биология	Русский язык	Математика	Физика	Химия	Технология	Литература	Музыкальная культура	Астрономия	

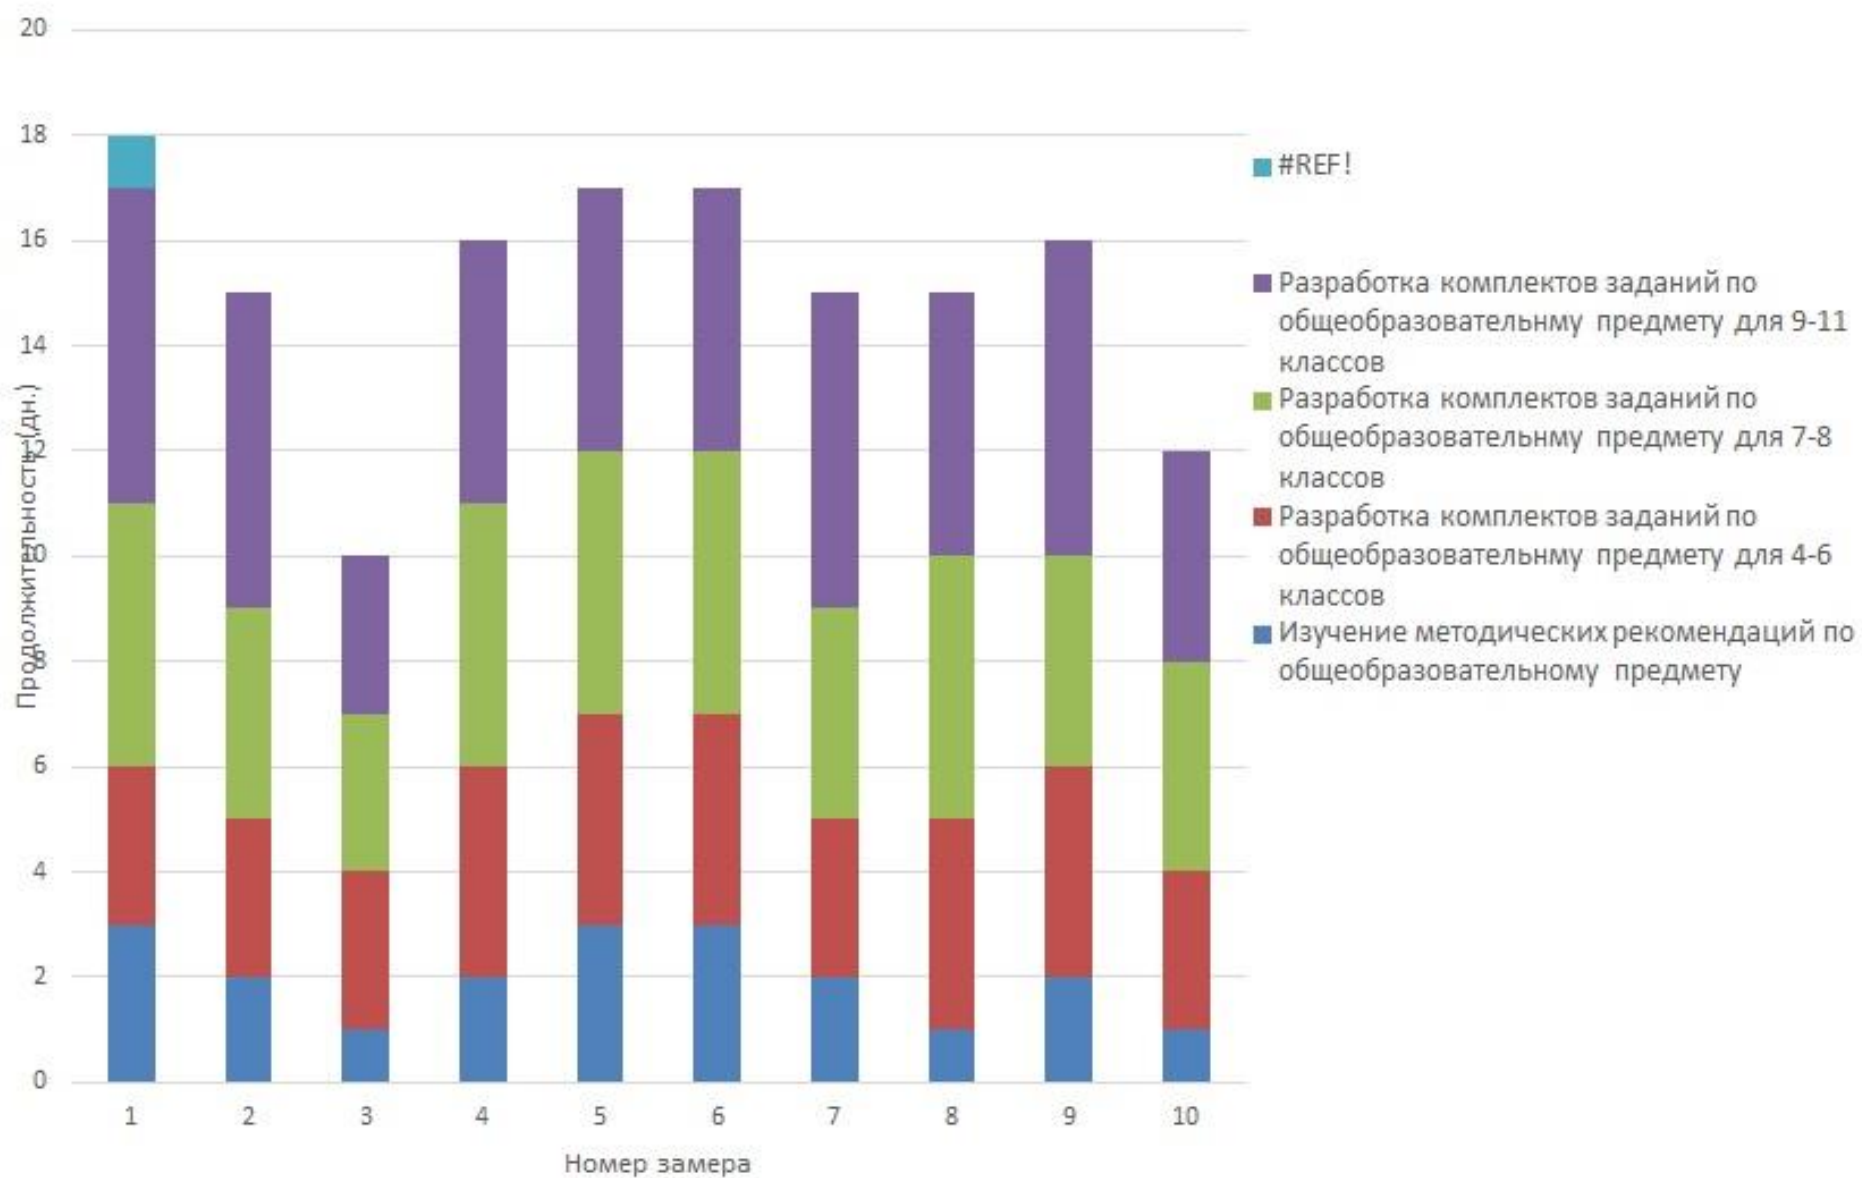

Динамика замеров статистического анализа № 1



# План мероприятий

<b>ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОЕКТА</b> «Оптимизация проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Воронежской области»		 <b>БЕРЕЖЛИВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО</b>		
<b>СОГЛАСОВАНО</b> Владелец процесса  Н.Н. Голева ФИО		<b>УТВЕРЖДАЮ</b> Заказчик проекта  Н.В. Салогубова ФИО		
№	Проблема	Мероприятия	Ответственный	Сроки
1	Разработка заданий педагогами разного уровня квалификации	1. Разработка ТЗ по заданиям для ШЭ ВСОШ по 18 общеобразовательным предметам.	Удовиченко Е.А.	с 11 июля по 31 августа 2022 года
2	Разнородность, разноуровневость заданий, отсутствие стандарта для всех школ региона	2. Поиск разработчиков заданий, достижение договоренности (оплата, сроки, комплектность).		
3	Невозможность соотнести результаты обучающихся разных муниципальных районов области	3. Составление договоров ГПХ с разработчиками. 4. Приемка заданий. 5. Загрузка заданий на ЦОПВО.	Зарайский С.О.	с 11 июля по 26 октября 2022 года
4	Отсутствие равных условий проверки (единых критериев оценки)	Проработка автоматизированной системы подсчета баллов.	Зарайский С.О.	с 11 июля по 26 октября 2022 года
5	Отсутствие рекламной кампании на уровне региона и внутри школы	1. Составление списка вопросов для интервьюируемых обучающихся 2. Съёмка роликов на базе ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион» 3. Монтаж видео. 4. Публикация роликов на сайте ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион»	Кроль Л.А. Зарайский С.О.	с 15 августа по 31 августа 2022 года
		1. Трансляция в сети интернет рекламных роликов с победителями/призерами регионального и заключительного этапов прошлых лет.	Бабенко А.В. Зарайский С.О.	с 1 сентября по 26 октября 2022 года



# План мероприятий

№	Проблема	Мероприятия	Ответственный	Сроки
1	Разработка заданий педагогами разного уровня квалификации	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Разработка ТЗ по заданиям для ШЭ ВСОШ по 18 общеобразовательным предметам.</li> <li>2. Поиск разработчиков заданий, достижение договоренности (оплата, сроки, комплектность).</li> <li>3. Составление договоров ГПХ с разработчиками.</li> <li>4. Приемка заданий.</li> <li>5. Загрузка заданий на ЦОПВО.</li> </ol>	Удовиченко Е.А.	реализовано
2	Разнородность, разноуровневость заданий, отсутствие стандарта для всех школ региона			
3	Невозможность соотнести результаты обучающихся разных муниципальных районов области			
4	Отсутствие равных условий проверки (единых критериев оценки)	Проработка автоматизированной системы подсчета баллов.	Зарайский С.О.	реализовано
5	Отсутствие рекламной кампании на уровне региона и внутри школы	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Составление списка вопросов для интервьюируемых обучающихся</li> <li>2. Съёмка роликов на базе ГАНУО ВО «Региональный центр «Орион»</li> <li>3. Монтаж видео.</li> <li>4. Публикация роликов на сайте ГАНУО ВО «Региональный центр «Орион»</li> </ol>	Кроль Л.А. Зарайский С.О.	реализовано
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Трансляция в сети интернет рекламных роликов с победителями/призерами регионального и заключительного этапов прошлых лет.</li> <li>2. Рассылка роликов в муниципалитеты для трансляции на уровне школ.</li> </ol>	Бабенко А.В. Зарайский С.О.	реализовано
6	Невозможность для обучающегося принять участие в школьном этапе ВСОШ в случае фактического отсутствия в образовательной организации	Проработка возможности участия в олимпиаде с любого устройства при любом местоположении (при условии наличия подключения в сети интернет).	Удовиченко Е.А.	реализовано
7	Затянутость времени ожидания личного результата обучающегося и общих рейтинговых списков	Проработка возможности фиксации личного результата участия в олимпиаде сразу после завершения ее прохождения	Зарайский С.О.	реализовано
8	Недоведение информации о проведении ВСОШ до исполнителя и потребителя	Дублирование всей информации о проведении ШЭ ВСОШ в чате для муниципальных кураторов и на сайте Регионального центра «Орион»	Удовиченко Е.А. Кроль Л.А. Говорова М.А.	реализовано
9	Неактуальность адресов электронных почт органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в сфере образования	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Составление информационного письма-запроса.</li> <li>2. Внесение изменений в список почт отделов образований и муниципальных кураторов ВСОШ для информационных рассылок.</li> </ol>	Кроль Л.А.	реализовано
10	Часто задаваемые вопросы, необходимость обновления памятки участника	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Контроль поступающих обращений (почтовый адрес технической поддержки, чат с муниципальными кураторами ВСОШ, телефоны «горячей линии»).</li> <li>2. Составление перечня наиболее часто возникающих проблем</li> <li>3. Составление памятки для сотрудников (для быстрых ответов) и обучающихся, педагогов.</li> </ol>	Удовиченко Е.А.	реализовано
11	Влияние параллельных задач на включение в процесс	Планирование работы сотрудников отдела сопровождения интеллектуальных состязаний с возможностью взаимозаменяемости: отслеживание графиков отпусков и планов мероприятий на неделю/месяц	Удовиченко Е.А.	реализовано
12	Технический сбой системы во время проведения олимпиады	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проработка всех возможных технических проблем.</li> <li>2. Обеспечение максимальной пропускной возможности системы на сервере.</li> </ol>	Зарайский С.О.	реализовано
13	Большой объем данных для итоговой обработки	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Выгрузка результатов по предметам и классам.</li> <li>2. Обработка результатов путем сортировки обучающихся по муниципалитетам и баллам.</li> <li>3. Рассылка рейтинговых таблиц по муниципалитетам.</li> </ol>	Зарайский С.О. Удовиченко Е.А. Кроль Л.А. Говорова М.А. Ярута Е.И.	реализовано



# Показатели

Цели проекта			
Наименование цели	Ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Увеличение количества работ участников Олимпиады по 24 общеобразовательным предметам на Цифровых образовательных платформах	работ	125 136	360 614
2. Увеличение количества общеобразовательных предметов школьного этапа Олимпиады, проводимых на цифровых платформах	шт.	6	24
3. Сокращение времени ожидания первичного результата	час	72	0,01
4. Сокращение времени на обработку результатов (рейтинговый список)	дни	14	7

Фактический показатель

350 001

24

0,01


7








# Стало



**Официальный сайт оператора Всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году на территории Воронежской области (ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион»)**

<https://vsosh-vrn.orioncentr.ru/shkolnyj-jetap-2021-2022-uchebnogo-goda/>



- разработка заданий специалистами ВУЗов;
- возможность написания Олимпиады из любого местоположения при наличии компьютера или телефона;
- единая база заданий, критериев оценки, автоматический подсчет баллов;
- отсутствие необходимости расходования бумаги, предоставления аудиторий и отрыва сотрудников от учебного процесса.



# Регламент действий по оптимизации проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников путем включения в процесс цифровой образовательной платформы

СОГЛАСОВАНО

Директор ГАНОУ ВО  
«Региональный центр «Орион»



Н.Н. Голева

## Регламент действий по оптимизации проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников путем включения в процесс цифровой образовательной платформы

<ol style="list-style-type: none"><li>1. Изучение Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, Методических рекомендаций по проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников</li><li>2. Выпуск НПА на уровне региона с фиксацией формата проведения всероссийской олимпиады школьников на цифровой платформе</li><li>3. Разработка технического задания для разработчиков согласно Методических рекомендаций по проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников</li><li>4. Поиск разработчиков (специалисты ВУЗов, образовательных центров и ассоциаций)</li><li>5. Заключение договоренностей, подготовка договоров по оплате услуг</li><li>6. Приёмка заданий от разработчиков, создание единой базы заданий внутри цифровой платформы путем загрузки заданий</li><li>7. Оплата услуг разработчиков</li><li>8. Контакт с разработчиками по содержанию заданий, критериям оценивания</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Разработка собственной платформы согласно запросам / поиск имеющейся платформы с необходимым функционалом / аренда платформы у сторонних организаций</li><li>2. Постоянная доработка возможностей и исправление проблем на платформе</li><li>3. Загрузка заданий на платформу</li><li>4. Мониторинг проблем, их фиксация, доработка</li><li>5. Фиксация итоговых результатов всероссийской олимпиады школьников</li><li>6. Выгрузка итоговых списков для отправки в муниципальные образования и дальнейшей статистической работы</li></ol>
--	---

# Информационное освещение


**Официальный сайт ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион»**  
<https://orioncentr.ru/>



**Пресс-конференция  
об особенностях организации олимпиадного  
процесса в новом учебном году  
Воронежский Дом журналистов | ВКонтакте  
(vk.com)**  
[https://vk.com/domjourvrn?w=wall-76867949\\_3215](https://vk.com/domjourvrn?w=wall-76867949_3215)







**Отдел сопровождения интеллектуальных состязаний  
ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион»**

**г. Воронеж, ул. 9 Января, д. 161, каб. 28**

**телефон +7 (473) 202-02-01**

**доб. 216 Екатерина Александровна Удовиченко**

**доб. 212 Марина Анатольевна Говорова**

**доб. 235 Lolita Андреевна Кроль**

**доб. 214 Елизавета Игоревна Ярута**



# Наши контакты



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  
ЦЕНТР ВОРОНЕЖСКОЙ  
ОБЛАСТИ

[vk.com/orion36\\_vrn](https://vk.com/orion36_vrn)



[olimpiada\\_36@mail.ru](mailto:olimpiada_36@mail.ru)  
[orioncentr.ru](http://orioncentr.ru)

